Vodohospodářské investice Úvaly
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
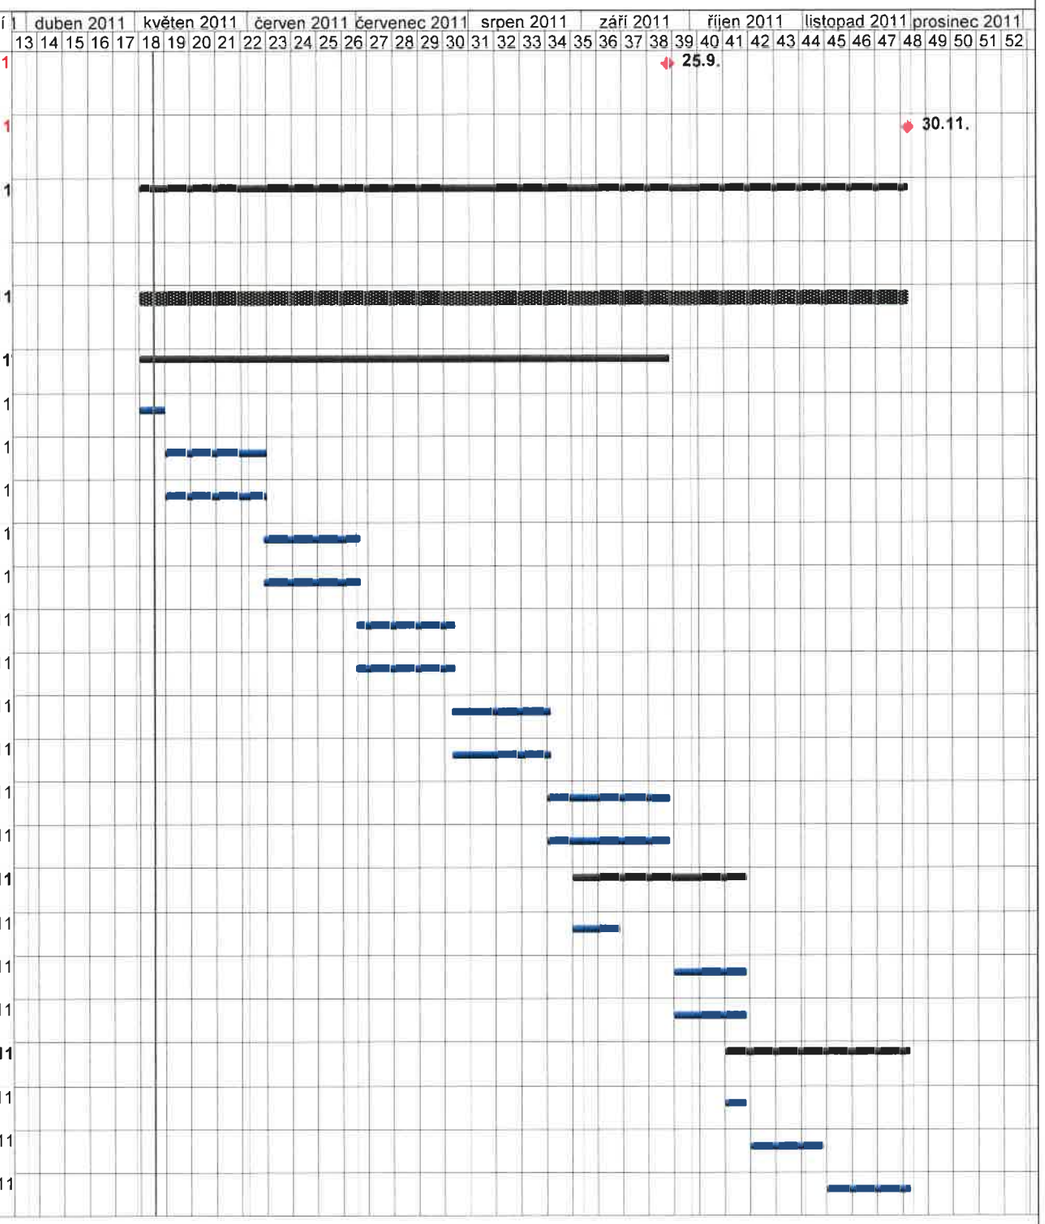
Název úkolu	Ulice	Staničení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Uzlový bod č. 1 - zprovoznění ulice Pražské			1 den	25.9. 11	25.9. 11
Uzlový bod č. 2 - dokončení lokality Pražská, Švermova, …			1 den	30.11. 11	30.11. 11
Uzavírka ulice Pražské po úsecích			212 dny	2.5. 11	29.11. 11
Lokalita Pražská, Švermova, Šafaříkova			212 dny	2.5. 11	29.11. 11
ulice Pražská			146 dny	2.5. 11	24.9. 11
přípravné práce a vytyčení	PRAŽSKÁ		7 dny	2.5. 11	8.5. 11
kanalizace úsek od Š 146 do Š 701 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,000 - 0,100	28 dny	9.5. 11	5.6. 11
vodovod 1. úsek od V1 do úrovně čp. 1231 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,000 - 0,075	28 dny	9.5. 11	5.6. 11
kanalizace úsek od Š 701 do Š 704 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,100 - 0,200	27 dny	5.6. 11	1.7. 11
vodovod 2. úsek od čp. 1231 do úrovně čp. 468 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,075 -0,175	27 dny	5.6. 11	1.7. 11
kanalizace úsek od Š 704 do Š 707 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,200 - 0,300	27 dny	1.7. 11	27.7. 11
vodovod 3. úsek od čp. 468 do úrovně čp. 1023 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,175 - 0,275	27 dny	1.7. 11	27.7. 11
kanalizace úsek od Š 707 do Š 709 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,300 - 0,400	27 dny	27.7. 11	22.8. 11
vodovod 3. úsek od čp. 1023 do úrovně čp. 456 vč. přípojek	PRAŽSKÁ	0,275 - 0,375	27 dny	27.7. 11	22.8. 11
kanalizace úsek od Š 709 do Š 711	PRAŽSKÁ	0,400 - 0,492	34 dny	22.8. 11	24.9. 11
vodovod 4. úsek od čp. 456 přes V3 do V5	PRAŽSKÁ	0,375 - 0,459	34 dny	22.8. 11	24.9. 11
ukice Švermova			**48 dny**	**29.8. 11**	**15.10. 11**
vodovod z V3 z ulice Pražská 1. úsek po čp.01	ŠVERMOVA	0,000 - 0,058	13 dny	29.8. 11	10.9. 11
kanalizace od stáv. šachta AE 4-4-1 do Š 712	ŠVERMOVA	0,000 - 0,050	20 dny	26.9. 11	15.10. 11
vodovod z V7 z ulice Šafaříkova k čp. 01 vč. propojení	ŠVERMOVA	0,058 - 0,106	20 dny	26.9. 11	15.10. 11
ulice Šafaříkova			**51 dny**	**10.10. 11**	**29.11. 11**
přípravné práce	ŠAFAŘÍKOVA		6 dny	10.10. 11	15.10. 11
kanalizace úsek od Š 112 do Š 114 vč. přípojek	ŠAFAŘÍKOVA	0,000 - 0,067	20 dny	17.10. 11	5.11. 11
kanalizace úsek od Š 114 do Š 116 vč. přípojek	ŠAFAŘÍKOVA	0,067 - 0,145	23 dny	7.11. 11	29.11. 11
